

Kutyamenhely Alapítvány

Trenyik Zsolt

kuratóriumi elnök

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának tagjai**

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának tagjai**

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Ezúton szeretnék beszámolni az Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány számára használatba adott területen folyó munkáról, az aktuális teendőinkről, egyúttal kérem a bizottságok tagjait, hogy szavazatukkal támogassák a két szervezet munkáját, és ezzel a menhely építését, hosszú távú működését.

Köszönettel: Trenyik Zsolt


Előzmények

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a 245/2016. (VI. 20.) GVB. sz. határozatával az Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány közös használatába adta a Náriai felé vezető út melletti önkormányzati terület használaton kívüli részét, határozott időre, ez év december 31-ig, egyhangú döntéssel, melyet ezúton is köszönünk!

Miután a használatba vételhez szükséges szerződést mindkét szervezet képviselője aláírta, a Szova Zrt. birtokba adta a területet, a megbízott földmérő a felosztást elvégezte, majd 2016. szeptember 8-án (második körben) a két szervezet számára használható területet kitűzte, ezzel kialakultak a végleges területhatárok.

A két szervezet a szerződés aláírását követően azonnal felmérte a terület adottságait, ide értve

- a meglévő közműveket
- a kiépíthető közműveket
- az engedélyezéshez szükséges egyéb követelmények teljesítésének módját
- a terület optimális felhasználását, figyelembe véve az ellátandó állatok fajtát, korát, egészségügyi státuszát (karanténban, fertőző részlegen elhelyezendő vagy nem)

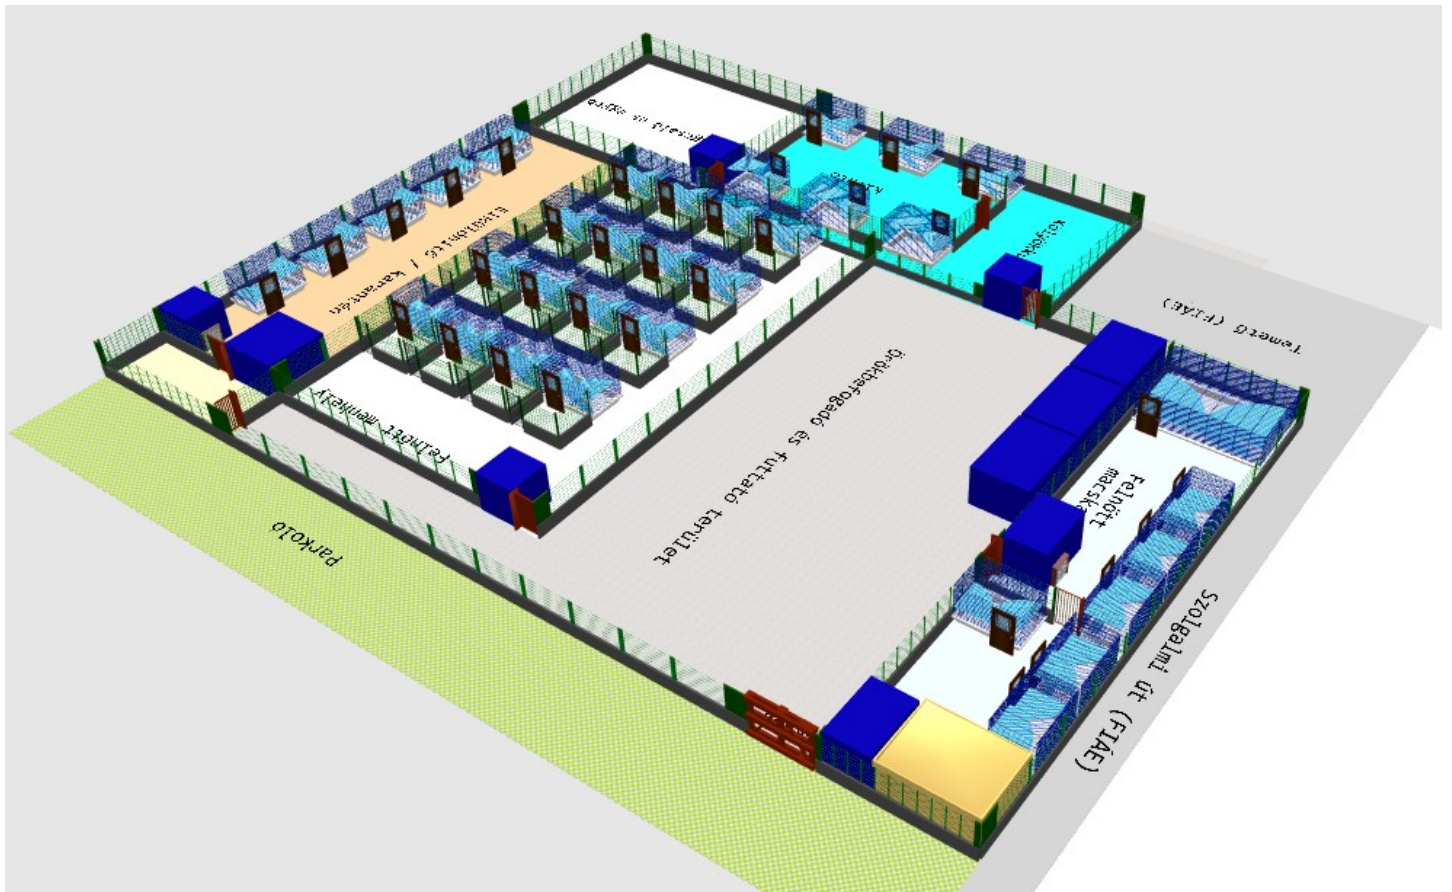

Az eddig elvégzett munkák

1. a terület pontos kimérése
2. a terület kitakarítása: az aljnövényzet eltávolítása, gyökértelenítés; veszélyes, korhadt fák kivágása; fűnyírás
3. a terület körbekerítése: 150 fm kerítés, 220 cm magas, betonoszlopokkal, a tetején szögesdróttal
4. konténerek elhelyezése: vásároltunk egy irodakonténert (iroda és öltöző célra), valamint kettő darab tárolókonténert (eszközök és eledel tárolására); mindhármat elhelyeztük a területen, a tárolók a helyükre kerültek, a szigetelt konténer ideiglenes helyen van, mert annak a műszaki előírás szerint cölöpalapot kell készíteni



A soron következő teendők:

1. a közművek biztosítása, lehetőség szerint: folyamatosan egyeztetünk az áramszolgáltatóval támogató cégen keresztül, rövid távon úgy tűnik, aggregátorral biztosítható csak az áramellátás; vízellátás és szennyvízkezelés témában a Nébihhel egyeztetünk, amint az építkezés olyan fázisba ér (előzetes egyeztetések természetesen történtek eddig is)
2. a belső kerítések kialakítása: a látványterven látható részterületek, melyek egy-egy funkciót látnak el, belső kerítésekkel lesznek elválasztva, az egészségügyi és a biztonsági követelményeknek megfelelően. A külső kerítés építéskor szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy ez a fázis sok energiát fel fog emészteni, mert a területnek bizonyos részei a gyökérzet miatt még gépi erővel is szinte kezelhetetlenek.
3. Kennelek, szigetelt házak, tárolókonténerek beszerzése, illetve elhelyezése

A területen eddig a fenti munkák nagyságrendileg egymillió forintos beruházást jelentettek úgy, hogy az élőmunkát igénylő feladatokat (pl. a terület rendbetétele, tisztítása) alkalmanként 8-10 önkéntes végezte. A faházak, mobilházak építését is minél nagyobb arányban szeretnénk saját erőből, tagokkal és önkéntesekkel megoldani.

Szombathely, 2016. szeptember 11.
